Brandschutzsanierung Rathaus

Anlage Fotos

Brandschutzkanäle:



Um die Brandlasten aus den Zwischenecken der notwendigen Flure zu reduzieren,
müssen sämtliche Installationsleitungen, die nicht für die Versorgung der Flure notwendig sind,
in Brandschutzkanäle verlegt werden.
Hierzu werden sämtliche bestehenden Leitungen in den Fluren abmontiert und in Kanäle umverlegt.




Brandschutzkanal mit Zulassung gemäß DIN 4102 Teil 11


Stirnseitige Schottung der Brandschutzkanäle und Übergänge



Wieder geschlossene Decke mit Lampenauslässe und Randfries.
Lampen, Rauchmelder, Präsenzmelder usw. sind noch nicht montiert.

Unterverteilungen:

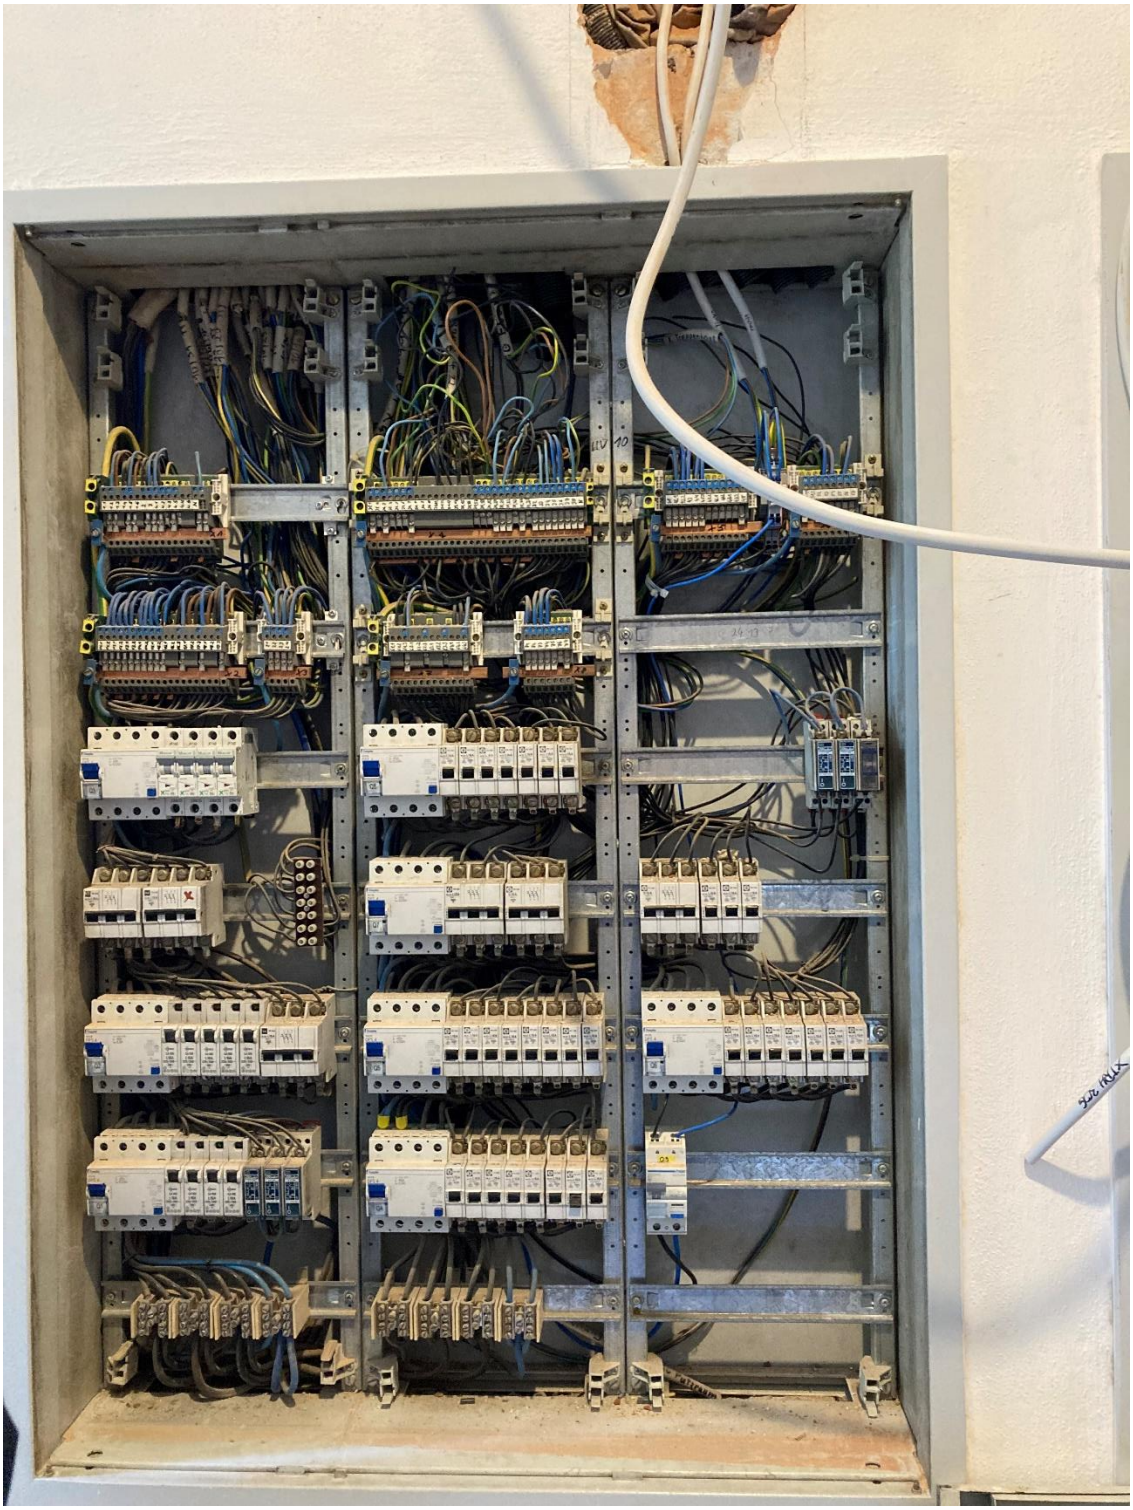

Unterverteilungen in den Fluren/ Treppenhäusern

ohne Berührungsschutz.

„gewachsene“ Verkabelung im Dachboden.



Nicht fachgerechte Elektroinstallation.
